


PDF 05 / ROADMAP

PROTOTYPE -> PRODUCTION

BRUXELLES 2026

ROADMAP PROTOTYPE & PRODUCTION

La carte de passage entre la preuve MVP, l'alpha produit, la production de contenu, la conformité, et la préparation investisseurs. Objectif: avancer sans se dissoudre.

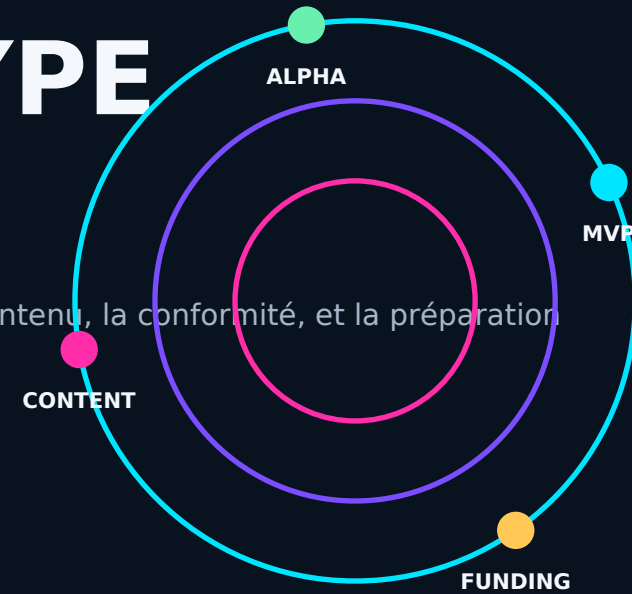

01 **Produit**
UX, Aman, assistant

02 **Tech**
Vault, logs, sécurité

03 **Contenu**
DA, vidéo, assets

04 **Business**
Bruxelles, partenaires

1. Carte exécutive: 180 jours sans brouillard

La suite logique du MVP 30 jours: ne pas ajouter de complexité avant d'avoir une preuve stable, montrable et gouvernée.



Règle de pilotage

On avance par preuves successives: chaque phase doit produire un livrable visible, un indicateur mesuré et une décision Go/Adjust/Stop. Rien ne part en production sans owner, métrique, risque et rollback.

2. Ce que le Drive impose comme discipline

Ce PDF ne repart pas de zéro: il consolide les livrables Master Architecture, Operating System, Dossier opérationnel, Creator Program et Data Vault.

Phase 0

Verrouiller les décisions avant de coder: produit, sécurité, légal, économie, infra.

MVP 90j

Aman guide + assistant utilisateur + mémoire contrôlée + 3 capacités + mini-Atelier + audit log.

Cadence

Weekly Exec, Product Council, Risk & Compliance, Infra Ops: pas de pilotage au feeling.

Production

Creator/Content pipeline, standards, telemetry, audit packs et roadmap 90j/180j/12 mois.

Traduction opérationnelle

La roadmap doit livrer en parallèle: (1) preuve produit, (2) preuve technique, (3) preuve sécurité/conformité, (4) preuve business, (5) preuve média. Sinon le projet reste spectaculaire mais non-finançable.

3. Les 5 rails de production

Chaque rail avance avec ses propres livrables, mais un seul rythme de décision. Le chaos est toléré dans les idées, pas dans l'exécution.

PRODUCT

Genesis / Aman / assistant

- Parcours création assistant
- Mini-Atelier cliquable
- Prototype démo 7 min

OUTPUT VERIFIABLE

TECH

Vault / runtime / logs

- Memory on/off
- Audit log exportable
- Policy engine v1

OUTPUT VERIFIABLE

CONTENT

DA / assets / vidéo

- Trailer court
- UI mockups
- Pack visuel investor

OUTPUT VERIFIABLE

BUSINESS

Bruxelles / partenaires

- hub.brussels
- shortlist partenaires
- dossier subventions

OUTPUT VERIFIABLE

GOVERNANCE

Risk / legal / KPIs

- Risk register
- Go/No-Go gates
- cadence weekly

OUTPUT VERIFIABLE

4. J0-J30: stabiliser la preuve

Le PDF 04 donne le détail jour par jour. Ici, on fixe les sorties de production qui transforment le MVP en actif réutilisable.

S1 - verrouillage

Scope, user story, storyboard démo, backlog priorisé, critères Go/No-Go.

S2 - maquette

Design system, écrans Genesis, mini-Atelier, mémoire on/off, dashboard simple.

S3 - prototype

Agent demo, 3 capacités utiles, logs, export, traces, content capture.

S4 - packaging

Narration 7 min, vidéo courte, one-pager technique, investor demo script.

Pack de sortie J30

Démo

Prototype utilisable en réunion, même si certaines fonctions sont simulées.

Deck

Slides et one-pager cohérents avec la démo, sans sur-promesse.

Evidence

Logs, décisions, risques, screenshots et métriques de test.

Ask

Besoin clair: budget, équipe, partenaires, calendrier 90 jours.

5. J31-J90: passer du prototype à l'alpha

Objectif: quitter la pure maquette. Le système doit commencer à produire des traces, des coûts, des erreurs et des apprentissages réels.

J31-J45 Alpha UX

Parcours Genesis complet, écrans MEMORIA, export de profil, design system verrouillé.

J46-J60 Alpha Tech

Backend léger, vault prototype, policy rules, trace_id, sandbox outils.

J61-J75 Alpha Content

Captures produit, trailer 45-60 sec, 12 assets visuels, scripts de démonstration.

J76-J90 Alpha Review

Tests utilisateurs, risk review, budget 180j, shortlist partenaires, dossier prêt RDV.

6. J91-J180: private beta

Production privée, créateurs sélectionnés, partenaires ciblés, retours structurés et conformité documentée.

BUILD

Stabiliser alpha, corriger flows, instrumentation, auth simple, exports.

- Release notes
- Bug triage
- Demo mode
- Cost log

TEST

10-25 testeurs ciblés, scripts de test, interviews, bugs, satisfaction.

- Cohort list
- Consent forms
- Feedback grid
- Scorecard

CONTENT

Saison zéro: trailer, démo Aman, 3 use cases, kit presse minimal.

- Shot list
- Voice/script
- Asset library
- Editorial plan

BUSINESS

Rendez-vous Bruxelles, partenaires IA/écoles/studios, dossier financement.

- CRM sheet
- Intro mails
- Funding map
- Board update

7. Pipeline: idée -> livrable

Le projet doit produire comme un studio: brief, script, design, build, QA, publication, mesure.



Règles de prod non négociables

- Un livrable sans owner n'existe pas.
- Un prototype sans métrique reste une illusion.
- Une release sans rollback est interdite.
- Un contenu sans droit/consentement est inutilisable.
- Une décision non documentée devient une dette.

8. KPIs et portes Go/No-Go

Le pilotage doit être simple: peu d'indicateurs, mais impossibles à esquiver. Si ça ne se mesure pas, ça ne gouverne pas.

80%

Activation

assistant créé + 1 tâche réussie pendant la démo

< 7 min

Compréhension

investisseur comprend produit, marché, besoin, next step

0 critique

Stabilité

aucune erreur bloquante pendant 3 démos consécutives

100%

Traçabilité

actions clés avec trace_id, owner, policy_version

1/semaine

Pipeline

une sortie démontrable: vidéo, deck, build, evidence pack

hebdo

Risque

registre risques mis à jour avant chaque décision majeure

Porte de décision mensuelle

GO si la preuve a progressé, si le risque est documenté, et si le prochain budget débloque un apprentissage mesurable. ADJUST si l'usage ou la clarté n'est pas validé. STOP si le scope grossit sans preuve.

9. Rail Bruxelles: réseau & financement

Bruxelles n'est pas une pause: c'est un avantage d'accès, de réseau, de conformité et de narration européenne.

hub.brussels

Entrée business: création, développement, réseau, export, implantation. Objectif: obtenir orientation et rendez-vous utiles.

Innoviris / GENAI

Piste à surveiller: GENAI 2026 suspendu pour les nouveaux projets, mais dossier POC IA à préparer pour reprise/alternatives.

AI Act readiness

Transformer la conformité en actif: transparence, mémoire gouvernée, logs, risk register, humain dans la boucle.

Actions concrètes à lancer pendant cette roadmap

- Prendre rendez-vous hub.brussels avec PDF 02 + PDF 03 + PDF 04 + présent PDF.
- Préparer un mini dossier POC GENAI même si le guichet 2026 est fermé.
- Créer une shortlist de 15 contacts: studios, écoles, IA, cloud souverain, juristes, incubateurs.
- Documenter société/statut/implantation pour éligibilité aides et partenariats.

10. Gouvernance d'exécution

Le système de travail doit être léger mais strict. Trop de réunions tue. Pas assez de gouvernance tue aussi. Ici: minimum viable governance.

Rôle	Décision	Cadence	Output
Founder/CEO	Vision, priorités, partenariats	Weekly Exec	decision log
Product Lead	Scope, UX, backlog, KPIs	Product Council	roadmap update
Tech/Sec Lead	Architecture, logs, policy, infra	Security review	risk register
Content Lead	DA, scripts, assets, vidéo, diffusion	Production review	asset board
Ops/PMO	planning, dependencies, budgets, vendors	Weekly Ops	delivery tracker

Cadence: weekly decisions / bi-weekly releases / monthly investor update

11. Registre des livrables

Le PDF 05 convertit les PDF 01-04 en machine de production et prépare le PDF 06: financements et incubateurs.

D1 - Product demo

Prototype Aman + assistant + mémoire + audit log.

D2 - Demo script

Script 7 minutes + version 90 secondes.

D3 - Evidence pack

Screens, logs, décisions, risques, métriques.

D4 - Content kit

Trailer, visuels, UI captures, page manifeste.

D5 - Partner map

15 contacts priorisés + statut + prochaine action.

D6 - Compliance pack

AI Act, RGPD, NIS2 posture, policy v1.

D7 - Budget 180j

Coûts par rail + hypothèses + seuils.

D8 - Investor update

Deck + one-pager + ask + roadmap validée.

Prochain document

PDF 06 - Dossier subventions / incubateurs Bruxelles-Europe: cartographie, critères, timing, scripts de contact et paquet de candidature.
